2024年下半年案例分析试题和试题解析（11月10日第3批）

淘宝 APP 扫码购课　　微信公众号　　野人老师抖音　　野人老师小红书

【2024 年 11 月第三批次试题一】

公司甲准备上线一款智能会议系统，现委托公司乙承担软件开发工作并要求开发工程师必须在公司甲的办公地驻场工作，公司甲的质量控制部门也加入此项目并由公司乙的项目经理小刘担任项目经理。

由于公司乙的测试工程师未在公司甲现场，所以每次版本迭代更新时，公司乙的开发工程师需先将软件版本发给本公司的测试工程师，测试完成后再提交公司甲的质量控制部门。

小刘带领开发团队到公司甲走马上任后，定义了不同功能版本上线时间并开始实施，临近上线小刘找到公司甲的质量控制工程师小赵，申请批准上线，小赵正在为公司的其他产品工作，无法及时响应，导致版本上线时间无法确定。同时，小赵反馈公司乙的软件团队未遵循公司甲的质量规范和流程，而且收到的版本未经过充分的测试，质量差，小赵多次与软件团队负责人小李沟通质量问题，小李认为小赵是故意刁难，两人在项目例会中屡次发生激烈争吵，小刘并未在意，小赵将小李投诉到小刘和公司乙总经理王总处，公司给小李书面警告并扣除 30%的绩效处罚，小李表示严格遵循公司乙的流程和规范进行研发，无法接受并申请辞职，小李辞职后接替人员未能及时到岗，造成项目进一步延误和延期。

【问题 1】（8 分）
请从人力资源和团队管理方面简要分析造成项目当前情况的原因。
【问题 2】（5 分）
请简述团队管理的主要工作。
【问题 3】判断正误。（5 分）
（1）进度计划中的活动安排可为团队管理提供依据。（）
（2）团队建设通常要经过形成阶段、震荡阶段、规范阶段、成熟阶段和解散阶段。缺一不可。（）
（3）获取资源过程中的人际关系技术主要是谈判。（）
（4）工作分解结构有利于资源的规划。（）
（5）获取资源过程的主要作用是根据项目类型和复杂程度确定适用于项目资源的管理方法和管理程度。（）

【参考答案】
【问题 1】（8 分）
（1）未制订资源管理计划指导资源管理和团队管理工作开展
（2）人力资源负荷不平衡，质量控制工程师小赵兼任其他工作，不能及时响应工作请求

（3）未进行有效的团队建设，团队氛围差，团队成员间不相互信任，如小李认为小赵是故意刁难
（4）团队之间缺乏有效的沟通渠道，小赵多次与软件团队负责人小李沟通质量问题均未能解决问题
（5）人员储备没有做好，小李离职后接替人员无法及时到位，造成项目进一步延误和延期
（6）在团队管理过程中未及时处理团队成员冲突，项目例会中小赵和小李屡次发生激烈争吵，小刘并未在意
（7）缺少绩效考核标准，小李严格遵循公司乙的流程和规范进行研发但仍受处罚
（8）项目经理欠缺管理经验，未及时处理团队出现的问题
【问题 2】（5 分）
管理团队的主要工作包括：
（1）在管理团队的过程中，分析冲突背景、原因和阶段，采用适当方法解决冲突。
（2）考核团队绩效并向成员反馈考核结果。
（3）持续评估工作职责的落实情况，分析团队绩效的改进情况，考核培训、教练和辅导的效果。
（4）持续评估团队成员的技能并提出改进建议，持续评估妨碍团队的困难和障碍的排除情况，持续评估与成员的工作协议的落实情况。
（5）发现、分析和解决成员之间的误解，发现和纠正违反基本规则的言行。
（6）对于虚拟团队，则还要持续评估虚拟团队成员参与的有效性。
【问题 3】（5 分）
（1）√
（2）×，P482：有一种关于团队发展的模型叫塔克曼阶梯理论，在该理论中提出团队建设通常要经过形成阶段、震荡阶段、规范阶段、成熟阶段和解散阶段。通常这五个阶段按顺序进行，有时团队也会停滞在某个阶段或退回到较早的阶段；而如果团队成员曾经共事过，项目团队建设也可跳过某个阶段。
（3）√，P480：适用于本过程的人际关系与团队技能一般为谈判
（4）√，范围基准为规划资源提供依据，可交付成果决定了要管理的资源类型和数量
（5）×，应该是规划资源管理的作用

【2024 年 11 月第三批次试题二】

某公司正在开发一个电子商务管理平台，为了满足不断变化的市场和用户需求，开发过程难免会频繁变更，项目经理初期确定了 CCB 和配置管理员，期望尽早实施版本控制应对变更。

项目开始后，人工智能技术迅速发展，项目决定将之前的聊天功能优化为智能聊天，产品名称随之更改为智能电子商务管理平台，项目经理向 CCB 提交了产品名称配置项的变更申请，CCB 立即批准了该变更申请。

智能聊天基于正在开发的聊天功能基础上加入人工智能相关算法实现，新加入的人工智能算法由李磊负责，原聊天功能的研发张天继续修复代码中已发现的缺陷，张天修复完成后提交代码到受控库，但 3 天后，项目经理发现缺陷在产品库中依然存在，经调研发现缺陷修复依赖账号模块，账号模块在产品库中的版本由于接口变化，比受控库中的版本高。

2 周后，李磊从受控库检出最新代码，将自己开发完成的人工智能算法部分合入并提交受控库时出现合并冲突，项目经理立即通知配置管理员和研发人员一起排查原因，由于没有找到配置文档和数据，2 天后才找到原因，聊天功能的需求与新变更的产品名称不匹配，张天未收到产品名称配置项变更的邮件，产品名称未变更。项目经理随后立即发起智能聊天功能需求的配置项的变更申请，CCB 审批通过后实施变更，问题得以解决。

【问题 1】（12 分）
结合案例，说明该项目配置管理存在哪些问题。
【问题 2】（3 分）
版本控制的主要作用有（）。
①跟踪代码和文档变更
②管理多人同时开发冲突
③管理项目团队的绩效
④确保版本同步
⑤自动生成项目文档
【问题 3】（5 分）
CCB 对变更评估时，要确定哪些内容。

【参考答案】
【问题 1】（12 分）
（1）未制订配置管理计划
（2）不能单独由项目经理来确定 CCB
（3）项目初期只确定了 CCB 和配置管理员，没有明确配置管理负责人和配置项负责人
（4）没有制订配置控制程序
（5）配置项名称变更时，没有经过评审，直接审批通过
（6）代码缺陷修复完成后直接提交受控库，未经评审
（7）在配置项修改时，未识别到受关联的配置项
（8）版本管理存在问题，受控制和产品库版本不一致
（9）没有制定有效的配置状态报告
（10）配置文档和数据没有归档保存
（12）未进行配置审计，聊天功能的需求与新变更的产品名称不匹配。
【问题 2】（3 分）
①②④
P221，版本控制最主要的功能就是追踪文件的变更。它将什么时候、什么人更改了文件的什么内容等信息如实地记录下来。每一次文件的改变，文件的版本号都将增加。除了记录版本变更外，版本控制的另一个重要功能是并行开发。软件开发往往是多人协同作业，版本控制可以有效地解决版本的同步以及不同开发者之间的开发通信问题，提高协同开发的效率。并行开发中最常见的不同版本软件的错误(Bug)修正问题也可以通过版本控制中分支与合并的方法有效地解决。
【问题 3】（5 分）
1、变更对项目的影响。
2、变更的内容是否必要。
3、变更的范围是否考虑周全。
4、变更的实施方案是否可行。
5、变更工作量估计是否合理。

【2024 年 11 月第三批次试题三】

某公司计划采购一个新网络安全系统，由 B 公司承建双方签订了成本加激励费用（CPIF）合同，合同中约定项目工期为 6 个月，目标成本为 100 万，目标费用 10 万。

yeren.taobao.com

【问题 1】（8 分）
请根据表中两种合同执行结果，把（1）-（4）的结果写在答题区相应栏内。

合同内容		执行情况 A	执行情况 B
目标成本	100	90	110
目标费用	10	10	10
分担比例	70:30	3	-3
实际支付	-	（1）	（2）
实际利润	-	（3）	（4）

【问题 2】（3 分）
请简述采购工作说明书的主要内容。
【问题 3】（6 分）
项目经理在采购中会使用到招标文件，请简明招标文件的类型及适用条件。

【参考答案】
【问题 1】
（1）103 （2）117 （3）13 （4）7

【野人老师注：】
成本加激励费用：为卖方报销履行合同工作所发生的一切合法成本（即成本实报实销），并在卖方达到合同规定的绩效目标时，向卖方支付预先确定的激励费用。在本合同下：
买方（甲方）70%，卖方（乙方）30%
●情况 A 属于实际成本小于目标成本
●如果实际成本小于目标成本，卖方可以得到的付款总数为“目标成本+目标费用-买方应享受的成本节约”。
（1）100+10-（100-90）*70%=103 （3）103-90=13
●情况 B 属于实际成本大于目标成本
●如果实际成本大于目标成本，卖方可以得到的付款总数为“目标成本+目标费用+买方应负担的成本超支”；
（2）100+10+（110-100）*70%=117 （4）117-110=7

【问题 2】
采购工作说明书的内容包括规格、所需数量、质量水平、绩效数据、履约期间、工作地点和其他要求。
【问题 3】
招标文件的类型及适用条件如下：
（1）信息邀请书（RFI）：如果需要卖方提供关于拟采购货物和服务的更多信息，就使用信息邀请书。
（2）报价邀请书（RFQ）：如果需要供应商提供关于将如何满足需求和（或）将需要多少成本的更多信息，就使用报价邀请书。
（3）建议邀请书（RFP）：如果项目中出现问题且解决办法难以确定，就使用建议邀请书。

【2024 年 11 月第三批次试题四】
某项目的甘特图如下：B 的紧前活动是 A，C 的紧前活动是 B，D 和 E 的紧前活动是 A，F 的紧前活动是 D 和 E，G 的紧前活动是 C 和 F。

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yeren.taobao.com

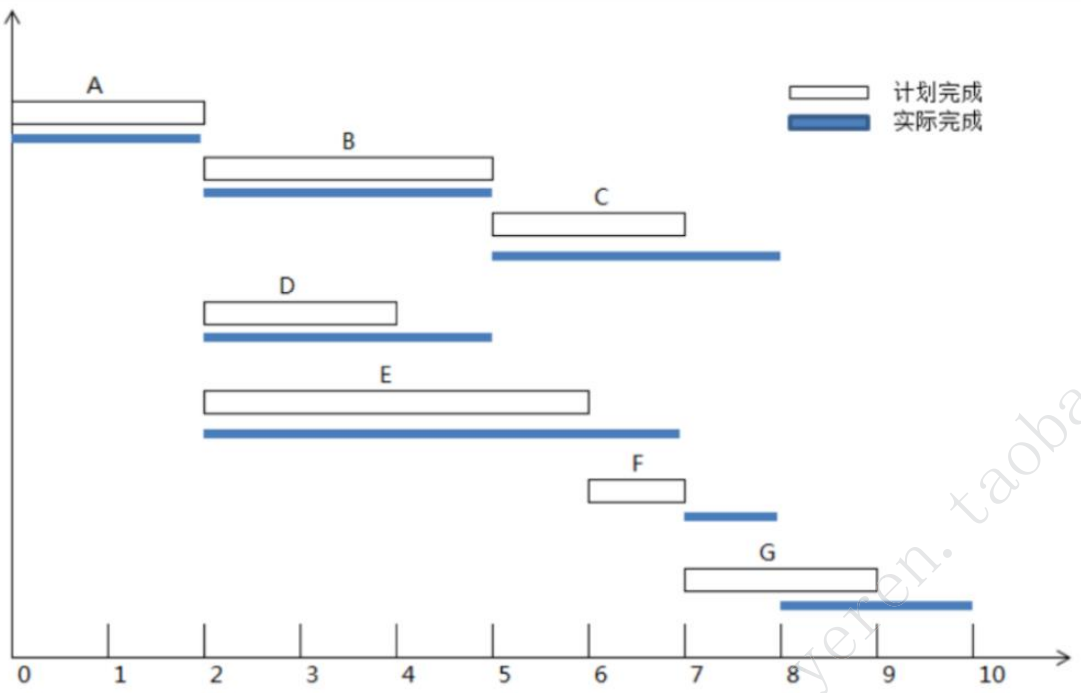

第 6 天末检查时，完成情况如下（单位：万元），此时实际花费 40 万元。

活动	A	B	C	D	E	F	G
计划工作量	10	8	8	6	20	5	8
实际工作量	100%	100%	50%	100%	80%	0	0

【问题 1】（6 分）

求活动 D 的总浮动时间，项目的关键路径。

【问题 2】（8 分）

项目执行第 6 天末的成本绩效指数和进度绩效指数，并判断项目的执行绩效。

【问题 3】（6 分）

项目的实际完成日期比计划完成日期延长（ ）天，（ ）活动对总工期造成了延误。

【参考答案】

【问题 1】

（1）D 的总浮动时间：2 天；项目的关键路径：ABCG 和 AEFG

【问题 2】

PV=A+B+1/2*C+D+E=10+8+1/2*8+6+20=48 万元

EV=10*100%+8*100%+8*50%+6*100%+20*80%=44 万元

AC=40 万元

SPI=EV/PV=44/48=0.92

CPI=EV/AC=44/40=1.1

SPI 小于 1，CPI 大于 1，所以进度落后，成本节约

【问题 2】

1，C 和 E。

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yeren.taobao.com
