2024年下半年案例分析试题和试题解析（11月11日第4批）

淘宝 APP 扫码购课　微信公众号　野人老师抖音　野人老师小红书

【2024 年 11 月第四批次试题一】

目前无背景文字部分，根据野人老师学员的回忆，案例分析考察的部分内容为：
考察领域：范围管理

【问题 1】
结合背景指出范围管理存在的问题?
【问题 2】
确认范围时需要检查的问题？
【问题 3】
发现需求跟产品范围不一致时，可以用什么项目文件？

【参考答案】
【问题 1】
由于本题目前没有背景部分，答案略
【问题 2】
项目干系人进行范围确认时，一般需要检查以下 6 个方面的问题：
（1）可交付成果是否是确定的、可确认的。
（2）每个可交付成果是否有明确的里程碑，里程碑是否有明确的、可辨别的事件，例如，客户的书面认可等。
（3）是否有明确的质量标准
（4）审核和承诺是否有清晰的表达
（5）项目范围是否覆盖了需要完成的产品或服务的所有活动， 有没有遗漏或错误。
（6）项目范围的风险是否太高：管理层是否能够降低风险发生时对项目的影响。
【问题 3】
需求文件。
P506 页，需求文件：用于发现任何对商定的项目或产品范围的偏离。

【2024 年 11 月第四批次试题二】

目前无背景文字部分，根据野人老师学员的回忆，案例分析考察的部分内容为：
考察领域：采购管理、招投标
【问题 1】
结合背景指出采购管理存在的问题?

【问题 2】
以项目付款方式为标准进行划分，通常可将合同分为哪几类？

【参考答案】
【问题 1】
由于本题目前没有背景部分，答案略
【问题 2】
总价类、成本补偿类、工料合同

【2024 年 11 月第四批次试题三】
目前无背景文字部分，根据野人老师学员的回忆，案例分析考察的部分内容为：
考察领域：风险管理
【问题 1】
结合背景指出风险管理存在的问题?
【问题 2】填空题
在定量风险分析中，使用模型来模拟单个项目风险和其他不确定性来源的综合影响，以评估它们对（1）的潜在影响。模拟通常采用蒙特卡洛分析。
对（2）进行蒙特卡洛分析时，使用项目成本估算作为模拟的输入；对（3）进行蒙特卡洛分析时，使用进度网络图和持续时间估算作为模拟的输入。开展定量成本和进度综合风险分析时，同时使用这两种输入，其输出就是（4）。

【参考答案】
【问题 1】
由于本题目前没有背景部分，答案略
【问题 2】
（1）项目目标（2）成本风险（3）进度风险（4）定量风险分析模型

【2024 年 11 月第四批次试题四】

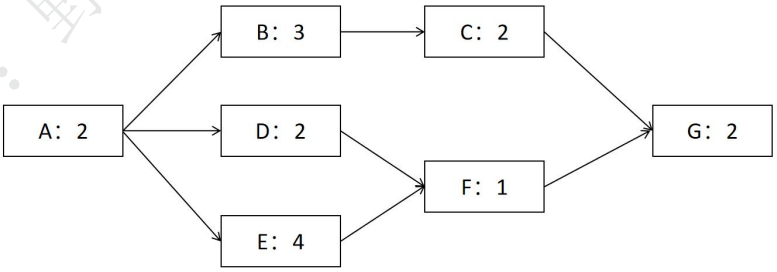

总工期 9 个月，以下为 6 个月的绩效情况，实际支出 70 万

活动	A	B	C	D	E	F	G
计划成本	20	15	18	6	30	3	6
百分比	100%	100%	50%	100%	80%		

【问题 1】（6 分）
求项目的关键路径和 D 活动的总浮动时间

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yeren.taobao.com

【问题 2】（8 分）
项目执行第 6 月末的绩效情况，每个活动成本按时间平均分配
【问题 3】（5 分）
项目经理控制进度应关注哪些内容？

【参考答案】
【问题 1】（6 分）
关键路径：ABCG 和 AEFG
D 活动的总浮动时间为 2 个月
【问题 2】（8 分）
PV=A+B+D+E+50%C=20+15+6+30+50%*18=80 万元
EV=A+B+50%C+D+80%E=74 万元
AC=70 万元
SV=EV-PV=74-80=-6 万元
CV=EV-AC=74-70=4 万元
SV<0，CV>0，所以进度落后，成本节约
【问题 3】（5 分）
1、判断项目进度的当前状态。
2、对引起进度变更的因素施加影响。
3、重新考虑必要的进度储备。
4、判断项目进度是否已经发生变更。
5、在变更实际发生时对其进行管理。

淘宝店铺：yeren.taobao.com
微信公众号：野人老师
