2024年下半年案例分析试题和试题解析（11月11日第5批）

淘宝 APP 扫码购课　微信公众号　野人老师抖音　野人老师小红书

【2024 年 11 月第五批次试题一】

目前无背景文字部分，根据野人老师学员的回忆，案例分析考察的部分内容为：

考察领域：质量管理

【问题 1】

结合背景指出质量管理存在的问题?

【问题 2】

软件质量保证 SQA 的定义、作用及主要任务是什么?

【参考答案】

【问题 1】

由于本题目前没有背景部分，答案略

【问题 2】

（1）软件质量保证的定义：软件质量保证（SQA）是建立一套有计划、有系统的方法，来向管理层保证拟定出的标准、步骤、实践和方法能够正确地被所有项目所采用。

（2）软件质量保证的主要作用是给管理者提供预定义的软件过程的保证。

（3）软件质量保证的主要任务包括：SQA 审计与评审、SQA 报告、处理不合格问题。

【2024 年 11 月第五批次试题二】

目前无背景文字部分，根据野人老师学员的回忆，案例分析考察的部分内容为：

考察领域：配置管理

【问题 1】

结合背景指出配置管理存在的问题?

【问题 2】

配置管理的关键成功因素有哪些?

【参考答案】

【问题 1】

由于本题目前没有背景部分，答案略

【问题 2】

配置管理的关键成功因素主要包括：

- 所有配置项应该记录；

淘宝店铺：yeren.taobao.com
微信公众号：野人老师

- 配置项应该分类；
- 所有配置项要进行编号；
- 应该定期对配置库或配置管理数据库中的配置项信息进行审计；
- 每个配置项在建立后，应有配置负责人负责；
- 要关注配置项的变化情况；
- 应该定期对配置管理进行回顾；
- 能够与项目的其他管理活动进行关联。

【2024 年 11 月第五批次试题三】

目前无背景文字部分，根据野人老师学员的回忆，案例分析考察的内容为：
考察领域：监理管理
【问题 1】
信息系统项目进行可行性研究包括哪些?
【问题 2】
技术可行性分析一般应考虑的因素包括?
【问题 3】
乙方和甲方长期合作，甲方准备开发人工智能项目，监理看了可行性研究报告发现乙方没有类似项目经验，项目风险太大，乙方表示有专业技术专家团队，甲方表示项目很赶，可以灵活处理，面对上述情况应该如何开展监理工作。

【参考答案】
【问题 1】
信息系统项目进行可行性研究包括：技术可行性分析、经济可行性分析、 社会效益可行性分析、运行环境可行性分析以及其他方面的可行性分析等。
【问题 2】
技术可行性分析一般应当考虑的因素包括：
①进行项目开发的风险；
②人力资源的有效性；
③技术能力的可能性；
④物资（产品）的可用性；
【问题 3】
本题教程上没有标准答案，言之成理即可得分。
（1）深入评估乙方：要求乙方提供详细团队资料，安排面试或技术交流会，考虑第三方评估。
（2）制定风险管理计划：明确风险识别、评估、监控和应对措施，特别关注技术、时间和质量风险。
（3）加强沟通与协调：促进甲乙双方有效沟通，定期召开协调会议，及时调整项目计划。
（4）灵活调整监理策略：增加监理频次，采用高效工具和方法，确保质量与进度并重。
（5）强化质量控制：制定明确验收标准，注重过程控制，确保项目成果满足需求。
（6）建立应急响应机制：制定紧急决策流程，资源调配方案，应对突发事件。案例分析:
可行性研究报告的内容。

【2024 年 11 月第五批次试题四】

某项目的进度计划如下图：A:3 表示 A 的工期为 3 个月。

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yeren.taobao.com

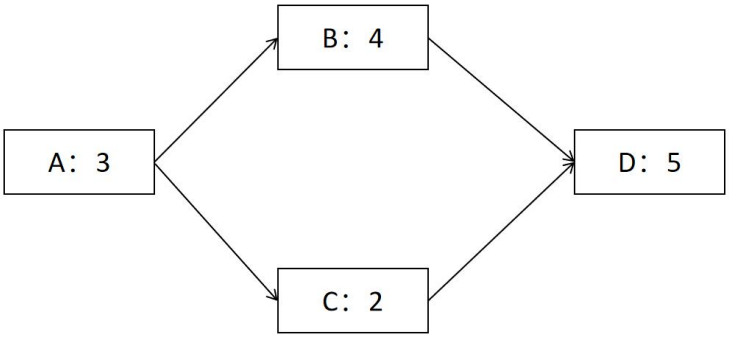

项目进行到第 6 个月，完成情况如下（单位：万）

活动	A	B	C	D
预算	20	30	15	35
实际消费	21	12	18	
百分比	100%	50%	75%	

【问题 1】（4 分）
求项目的关键路径和工期。
【问题 2】（4 分）
求项目各个活动的 EV。
【问题 3】（7 分）
求项目第 6 个月末的项目的绩效情况。
【问题 4】（4 分）
请写出制定进度计划的工具和技术。

【参考答案】
【问题 1】（4 分）
关键路径：ABD（2 分）
工期 12 个月（2 分）
【问题 2】（4 分）
活动 A：EV=20（1 分）
活动 B：EV=30*50%=15（1 分）
活动 C：EV=15*75%=11.25（1 分）
活动 D：EV=0（1 分）
【问题 3】（7 分）
PV=A+（3/4）B+C=20+（3/4）*30+15=57.5（1 分）
EV=A+50%*B+75%*C=20+15+11.25=46.25（1 分）
AC=21+18+10=49（1 分）
SPI=EV/PV=46.25/57.5=0.80（1 分）
CPI=EV/AC=46.25/49=0.94（1 分）
（或者求 SV、CV 也可以）
因为 SPI<1,CPI<1,所以进度落后，成本超支。（2 分）
【问题 4】（4 分）写出其中 4 个就行
1.进度网络分析 2.关键路径法 3.资源优化 4.数据分析 5.提前量和滞后量 6.进度压缩 7.计划评审技术 8.项目管理信息系统 9.敏捷发布规划

淘宝店铺：yeren.taobao.com
微信公众号：野人老师
