2025年下半年案例分析试题和试题解析（11月9日第3批）

淘宝 APP 扫码购课　微信公众号　野人老师抖音　野人老师小红书

【2025 年 11 月第三批次试题一】

目前无完整背景文字部分，根据野人老师学员的回忆，案例分析考察的部分内容为：

风险 1 的应对措施：专业能力强的工程师要离职，可能导致进度推迟，经项目经理与其沟通，加薪，最终工程师撤销离职申请；
风险 2 的应对措施：项目进程中，客户总是频繁提出变更需求，导致进度推迟，经过和客户沟通，客户了解到会对项目有影响，客户最后变更需求减少了次数，从 5 次变更申请变成了 1 次；
风险 3 的应对措施：音响系统开发的很好,投入更多普通工程师一起研究新技术，通信效率提高了；
风险 4 的应对措施：音响系统开发的很好，很有市场，现在需要补充技术能力，自己没这个能力做，找战略合作伙伴，签订战略合作协议；
风险 5 的应对措施：系统有一个模块，自己缺乏研发能力，外包给 ABCD 四个公司。

【问题 1】（6 分）
风险管理的过程中（1）_____过程输出了工作绩效信息。
定义：在整个项目期间，监督商定的风险应对计划的实施，（2）_____、（3）_____，以及评估风险管理有效性的过程
【问题 2】（5 分）
案例中 5 个风险分别采取了什么应对策略？
【问题 3】（5 分）
项目成功预计可以获利 100 万元，但在工作中发现有一项技术对项目有影响，组织目前缺少该技术，外包给 ABCD 四个公司去做，根据决策树分析，应该选择哪家公司进行分包？

公司	报价（万）	成功率	失败赔偿（万）
A	40	70%	0
B	60	80%	20
C	70	85%	30
D	90	95%	40

【问题 4】（4 分）（填空题）
风险的分类
（1）按风险后果划分：（）、（）
（2）按风险来源划分：（）、（）

【参考答案】
【问题 1】（6 分）
（1）监督风险
（2）并跟踪已识别风险
（3）识别和分析新风险
【问题 2】
（1）规避、（2）减轻、（3）提高、（4）分享、（5）转移
【问题 3】
本题有一些歧义，有两种理解方法，根据考后同学的反馈得分来看，更推荐第 1 种方法。
失败赔偿如果表示分包商赔给我们软件公司的钱
A 公司:期望收益 EMV =（100-40）*70% +（0-40）*30% = 30（万元）
B 公司:期望收益 EMV =（100-60）*80% +（20-60）*20% = 24 （万元）
C 公司:期望收益 EMV =（100-70）*85% +（30-70）*15% =19.5 （万元）
D 公司:期望收益 EMV =（100-90）*95% +（40-90）*5% =7 （万元）
失败赔偿如果表示我们软件公司赔给甲方的钱
A 公司:期望收益 EMV =（100-40）*70% +（0-40）*30% = 30（万元）
B 公司:期望收益 EMV =（100-60）*80% +（-20-60）*20%=16 （万元）
C 公司:期望收益 EMV =（100-70）*85% +（-30-70）*15%=10.5 （万元）
D 公司:期望收益 EMV =（100-90）*95% +（-40-90）*5% =3 （万元）
因为 A 公司 EMV 最高，所以选择 A 公司的方案。
【问题 4】
（1）按风险后果划分：纯粹风险、投机风险
（2）按风险来源划分：自然风险、人为风险

【2025 年 11 月第三批次试题二】
某项目的相关情况如表所示。时间单位：周

活动	最乐观时间	最可能时间	最悲观时间	活动成本	紧前活动
A	1	2	3	10	-
B	3	4	11	20	A
C	3	4	5	18	A
D	1	2	9	15	A
E	3	6	15	25	B、C、D
F	2	9	10	20	D
G	2	3	4	12	E、F

【问题 1】（6 分）
（1）请按照三点估算（贝塔分布）计算每个活动的持续时间，并给出项目的关键路径以及总工期。

【问题 2】（9 分）
第 7 周结束时：
（1）A、B、C、D 严格按照预算执行，A、B、C、D 活动已完成；
（2）F 完成了 50%，实际花费 15 万元；
（3）E、G 活动尚未开始。
请计算 CV、SV，以及判断目前的绩效情况。
【问题 3】（5 分）
请计算 E 活动 5 周内完成的概率。

【参考答案】
【问题 1】（6 分）

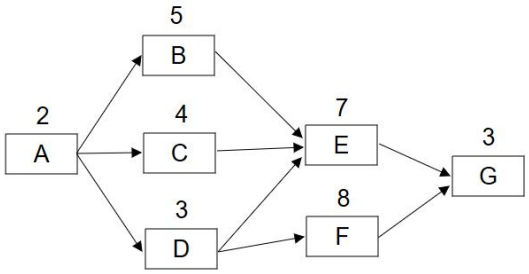

A 工期（1+2*4+3）/6=2 周
B 工期（3+4*4+11）/6=5 周
C 工期（3+4*4+5）/6=4 周
D 工期（1+2*4+9）/6=3 周
E 工期（3+6*4+15）/6=7 周
F 工期（2+9*4+10）/6=8 周
G 工期（2+3*4+4）/6=3 周

关键路径：ABEG，工期 17（周）
【问题 2】（9 分）
PV=A+B+C+D+（2/8）*F=10+20+18+15+（2/8）*20=68（万元）
EV=A+B+C+D+50%*F=10+20+18+15+50%*20=73（万元）
AC=10+20+18+15+15=78（万元）

CV=EV-AC=73-78=-5（万元）
SV=EV-PV=73-68=5（万元）
因为 CV<0，SV>0，所以成本超支；进度超前。
【问题 3】（5 分）
E 活动，期望工期是 7 周，标准差 =（15-3）/6=2 周，5 周内完成的概率 50%-34%=16%（或者 50%-34.1%=15.9%或者算出 15.85%也行）

淘宝店铺：yeren.taobao.com
微信公众号：野人老师

【2025 年 11 月第三批次试题三】
目前无背景文字部分，根据野人老师学员的回忆，案例分析考察的部分内容为：
考察领域：整合管理

【问题 1】（6 分）
（1）项目整合管理哪些过程会使用到问题日志?
（2）案例中 6 个问题分别属于整合管理哪个过程?
【问题 2】（6 分）
针对项目团队成员不愿意分享和转移知识，项目团队成员之间不信任，知识来源分散，知识管理应该采取什么措施？
【问题 3】（5 分）
知识管理过程通常包括：知识获取与集成、（1）、（2）、（3）和知识管理审计。（4）在项目早期创建，作为管理项目知识过程的输出。因此，在整个项目期间，它可以作为很多过程的输入,也可以作为输出而不断更新。参与工作的个人和团队也参与记录经验教训。可以通过视频、图片、音频或其他合适的方式记录知识，确保有效吸取经验教训。项目或阶段结束时，应把相关信息归入经验教训知识库，成为（5）的一部分。

【参考答案】
【问题 1】（6 分）
（1）监控项目工作、结束项目或阶段
（2）
1.制定项目管理计划（题干中提到了制定项目管理计划）
2.指导与管理项目工作（项目成员要请假，可能影响项目整体进度）
3.实施整体变更控制（在执行过程中，收到了客户的电话，客户提出新的需求）
4.指导与管理项目工作（研发过程中，研发经理发现、部分数据迁移不了）
5.监控项目工作（测试人员发现了，测试环境与开发环境不兼容，测试不了）
6.管理项目知识（团队成员之间不信任，不愿意分享隐性知识）
【问题 2】（6 分）
（1）要创造一个相互信任的氛围，以增加知识分享
（2）激励人们分享知识，对主动积极分享的员工进行奖励
（3）应明确与知识分享有关的权责
（4）采用合适的知识分享途径和方法
（5）使用知识管理的工具
（6）建立知识库或知识管理系统
（7）定期开展知识分享相关交流会,以促进知识分享
【问题 3】（5 分）
（1）知识组织与存储、（2）知识分享、（3）知识转移与应用（4）经验教训登记册（5）组织过程资产

【2025 年 11 月第三批次试题四】
目前无背景文字部分，根据野人老师学员的回忆，案例分析考察的部分内容为：
考察领域：采购管理

【问题 1】（10 分）
（1）采购管理包括哪些子过程?
（2）结合案例，在采购管理各个子过程执行了哪些活动?
【问题 2】（6 分）
（1）A 文件给了你，规格、 所需数量、质量水平、绩效数据、履约期间、工作地点和其他要求。问你这个 A 文件属于哪个文件（采购工作说明书）。
（2）采购工作说明书，采购管理计划，采购策略的主要内容分别包含什么？
【问题 3】（3 分）
案例中哪些活动属于合同管理活动?

【参考答案】
【问题 1】（10 分）
（1）规划采购管理、实施采购、控制采购
（2）
规划采购管理：编制了采购管理计划、采购工作说明书、采购策略、制定招标文件
实施采购：招标、投标、评标和授标、签订合同
控制采购：跟踪设备的到货情况和付款情况
【问题 2】（6 分）
（1）采购工作说明书
（2）采购管理计划的内容：
①如何协调采购与项目的其他工作，例如项目进度计划制订和控制；
②开展重要采购活动的时间表；
③用于管理合同的采购测量指标；
④与采购有关的干系人角色和职责，如果执行组织有采购部，项目团队拥有的职权和受到的限制；
⑤可能影响采购工作的制约因素和假设条件；
⑥司法管辖权和付款货币；
⑦是否需要编制独立估算，以及是否应将其作为评价标准；
⑧风险管理事项，包括对履约保函或保险合同的要求，以减轻某些项目风险；
⑨拟使用的预审合格的卖方等。

采购策略：包括项目交付方法、具有法律约束力的协议类型、如何在采购阶段推动采购进展。或者回答（交付方法、合同支付类型、采购阶段相关的信息）

工作说明书的内容包括：规格、所需数量、质量水平、绩效数据、履约期间、工作地点和其他要求。
【问题 3】（3 分）
（1）签订采购合同 （2）按照合同约定支付首付款 （3）跟踪合同付款情况

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yeren.taobao.com
