2017年上半年案例分析

【2017 年 05 月试题一】（18 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3,将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 公司想要升级其数据中心的安防系统，经过详细的可行性分析及项目评估后，决定通过公开招标的方式进行采购。某系统集成商 B 公司要求在投标前按照项目实际情况进行综合评估后才能做出投标决策。B 公司规定：评估分数（按满分为 100 分进行归一化后的得分）必须在 70 分以上的投标项目才具有投标资格。于是 B 公司项目负责人张工在购买标书后，综合考虑竞争对手、项目业务与技术等因素，编制了如下评估表：

序号	评估对象	评估级别	单位级别相对重要程度	加权得分	评估级别说明
1	回款容易程度	5	8	40	0：非常困难，回款可能性小于 20%； 1：比较困难，回款可能性小于 50%； 2：困难，回款可能性小于 60%； 3：有一定困难，回款可能性小于 70%； 4：基本没有难度。回款可能性小于 90%； 5：应该没有问题，回款可能性大于 90%。
2	项目业务熟悉程度	4	3	12	0：完本不熟悉； 1：熟悉程度低于 20%； 2：熟悉程度低于 40%； 3：熟悉程度低于 60%； 4：熟悉程度低于 80%； 5：熟悉程度高于 80%。
3	项目技术熟悉程度	5	3	15	0：完全不熟悉； 1：熟悉程度低于 20%； 2：熟悉程度低于 40%； 3：熟悉程度低于 60%； 4：熟悉程度低于 80%； 5：熟悉程度高于 80%。
4	竞争生出可能性	2	8	16	0：竞争非常激烈，中标可能性为 0； 1：竞争高度激烈，中标可能性不超过 20%； 2：竞争比较激烈，中标可能性不超过 50%； 3：竞争激烈程度不高，中标可能性不超过 70%； 4：竞争激烈程度较低，中标可能性不超过 90%； 5：几乎没有竞争，中标可能性超过高于 90%。
合计得分					

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com

归一化评估结果分					

【问题 1】（6 分）

综合上述案例，请帮助项目经理张工计算该项目的评估结果（包括合计得分和归一化结果）。

【问题 2】（4 分）

基于以上案例，如果你是 B 公司管理层领导，对于该项目，是决定投标还是放弃投标？为什么？

【问题 3】（8 分）

请指出项目论证应包括哪几个方面？

【参考答案】

【问题 1】（6 分）

此问题参见中级教材第二版 P238-240 页，有类似的阅读材料，也有归一化评估的说明。不过在案例里考确实还是少见，再次提醒大家教材还是要认真去看。具体计算如下：

1.合计得分为各加权得分的合计：40+12+15+16=83；

2.归一化评估结果=100X$\sum_{i=1}^{4}$ 评估结果 $_i$X 相对重要程度 $_i$/（$\sum_{i=1}^{4}$5 X 相对重要程度 $_i$）= 100X（40+12+15+16）/（5*8+5*3+5*3+5*8）=75.5

公式说明：其中$\sum_{i=1}^{4}$ 评估结果是指上表中的四类影响因素；$\sum_{i=1}^{4}$5 是指评估级别为 5 级。

【问题 2】（4 分）

决定投标。因为归一化评估结果为 75.5 分，大于规定的 70 分。

【问题 3】（8 分）

项目论证的内容：

包括项目运行环境评价、项目技术评价、项目财务评价、项目国民经济评价、项目环境评价，项目社会影响评价、项目不确定性和风险评价、项目综合评价等。

【2017 年 05 月试题二】（22 分）

阅读下列说明，针对项目的进度管理，回答问题 1 至问题 4。将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某项目细分为 A、B、C、D、E、F、G、H 共八个模块，而且各个模块之间的依赖关系和持续时间如下表所示：

活动代码	紧前活动	活动持续时间（天）
A		5
B	A	3
C	A	6
D	A	4
E	B、C	8
F	C、D	5
G	D	6

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com

H	E、F、G	9

【问题 1】（4 分）

计算该活动的关键路径和项目的总工期

【问题 2】（8 分）

（1）计算活动 B、C、D 的总体时差

（2）计算活动 B、C、D 的自由时差

（3）计算活动 D、G 的最迟开始时间

【问题 3】（5 分）

如果活动 G 尽早开始，但工期拖延了 5 天，则该项目的工期会拖延多少天？请说明理由。

【问题 4】（5 分）

请简要说明什么是接驳缓冲和项目缓冲。如果采取关键链法对该项目进行进度管理，则接驳缓冲应该设置在哪里？

【参考答案】

【问题 1】（4 分）

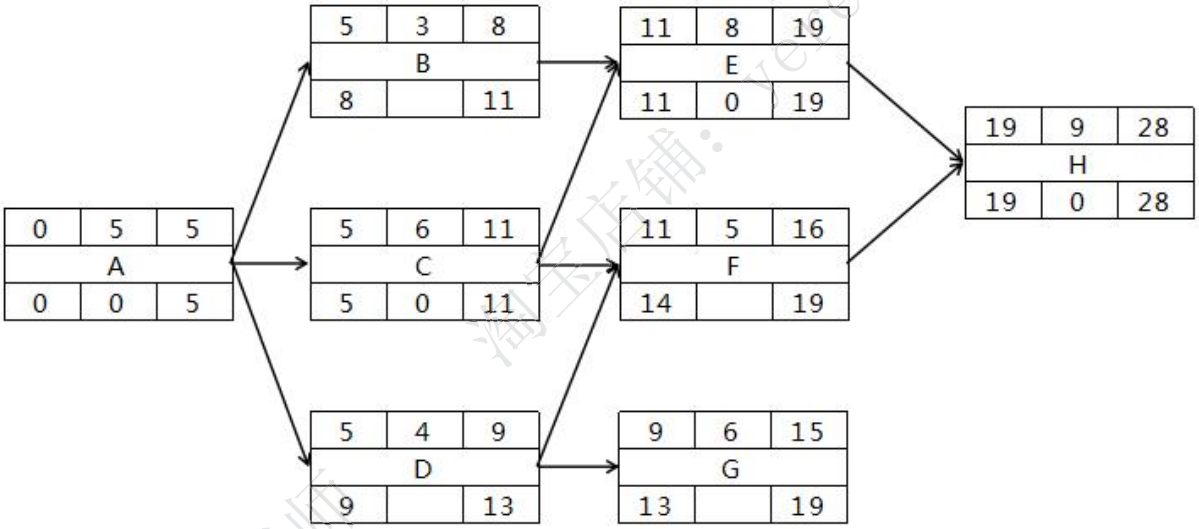

工期 28 天，关键路径为：ACEH。

【问题 2】（8 分）

看上图，得：

B、C、D 的总体时差分别为：3 天、0 天（C 在关键路径上）、4 天（也可以看 D 所在路径最长路径为 ADGH，工期 28-ADGH：24=4）

B、C、D 的自动时差分别为：3 天、0 天、0 天；

活动 D、G 的最迟开始时间为：第 10 天早上和第 14 天早上。（见上图，因为 D 和 G 有四天的总时差，按计划 D 是从第 6 天早上开始，G 是从第 10 天早上开始，加上总时差 4 天，所以 D 可以从第 10 天早上开始，G 可以从第 14 天早上开始。需要注意的是，如果画七格图从第 0 天开始的话，在七格图上 D 和 G 的最迟开始是 9 和 13,但这个代表的是第 9 天和第 13 天结束时，所以这里推荐答案最迟开始时间为第 10 天早上和第 14 天早上）。

【问题 3】（5 分）

如果 G 工期拖延了 5 天，项目工期会拖延 1 天，因为 G 只有 4 天的总时差。

【答案 4】（5 分）

接驳缓冲：放置在非关键链与关键链的接合点，用来保护关键链不受非关键链延误的影响。
项目缓冲：放置在关键链末端的缓冲称为项目缓冲，用来保证项目不因关键链的延误而延误。
接驳缓冲应放置在非关键链与关键链的接合点。

【2017 年 05 月试题三】（19 分）
阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3,将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】

某政府部门为了强化文档管理，实现文档管理全部电子化，并达到文档的实时生成和同步流转的目标，使文档管理有一次突破性升级，拟建设一个新的文档管理系统。项目主要负责人希望该系统与政府部门正在建设的新办公大楼能够同期投入使用，因此该部门将原来预计的文档管理系统的开发时间压缩了 3 个月，然后据此制定了招标文件并进行了招标。

某公司长期从事系统集成项目，但是并不具备文档管理系统的开发经验。在参与此项目的招投标时，虽然认为项目风险较大，但为了企业的业务发展，还是觉得投标，并最终中标。

张某被任命为该项目的项目经理。考虑到该公司对此类项目尚无成熟案例，他认为做好项目风险管理很重要，就参照以前的项目模板，编制了一个项目风险管理计划，经公司领导签字后就下发各小组实施。但随着项目的进行，各成员发现项目中面临的问题与风险管理计划缺乏相关性，就按照各自理解对实际风险控制和应对措施进行了安排，致使验收一拖再拖，项目款项也迟迟不能收回。

【问题 1】(10 分)

请指出该项目经理在项目风险管理方面存在哪些问题？

【问题 2】(4 分)

针对该项目的情况，请指出项目中存在的具体风险性，并简要说明。

【问题 3】(5 分)

在(1)~(5)中填写恰当内容(从候选答案中选择一个正确选项，将该选项编号填入答题纸对应栏内)。

项目经理在编制风险管理计划时，参考了以前的计划模板，该计划模板属于(1);按照项目的目标把风险进行结构化分解，得到的是(2)；在风险识别时，要考虑(3)中所定义的各项假设条件的不确定性；在风险识别时，可参考(4)库中的历史项目风险数据；在进行风险分析时，需要进行风险数据的(5)评估，以确定这些风险数据对风险管理的有用成分。候选答案：

A、组织过程资产	B、咨询	C、风险	D、质量
E、项目范围说明书	F、评审	G、工具	H、RBS

【参考答案】
【解析】
【答案 1】(10 分)
（1）编制风险管理计划存在问题，未结合本项目的实际情况编制计划，仅参照以前的项目模板来编制，而且公司还对此类项目尚无成熟案例；
（2）编制风险管理计划不由只由项目经理一个人来编制，应由项目团队和相关干系人共同参与，并经充分沟通和评审后才能发布实施；
（3）缺乏风险识别过程，没有对风险进行全面识别，以做好后续风险管理；
（4）缺乏风险的定性和定量分析过程，没有对风险进行详细分析，风险评估和控制缺少依据；
（5）缺乏风险应对规划，没有提前制定好风险的规划应对措施，出现问题时只按各自理解对风险进行处理，导致项目问题不断；

（6）没有做好风险控制工作，对风险做再评估和审计及偏差趋势分析等，缺乏有效的风险监控的工具和技术；
（7）开发时间压缩了 3 个月，没有对进度风险及关联影响进行充分评估，在应对进度风险方面没有做好相应的准备和安排，也未预留储备
（8）没有做好技术绩效测量工作，及时进行评审和绩效对比，及时纠偏；
（9）在项目执行过程中，与客户缺乏沟通，这会产生很多不必要的项目风险和隐患；
（10）风险管理计划也没有进行追踪检查和更新，没有及时记录和归档。
【答案 2】(4 分)

此项目存在的具体风险包括:

1、技术风险，因为该企业不具备文档管理系统的开发经验

2、管理风险，在项目管理过程中，缺乏规范的项目管理过程及项目管理的经验

3、进度风险，预计的完成时间压缩了 3 个月，存在较大进度风险，且没有应对措施;

4、人员风险，项目经理及团队没有开发经验，也未寻求外部资源协助

【答案 3】(5 分)

(1)A；(2)H；(3)E；(4)A；(5)D

【2017 年 05 月试题四】（16 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3,将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某大型国企 A 公司近几年业务发展迅速，陆续上线了很多信息系统，致使公司 IT 部门的运维工作压力日益增大，A 公司决定采用公开招标的方式选择 IT 运维服务供应商。

A 公司选择了一家长期合作的，资质良好的招标代理机构，并协助其编写了详细的招标文件,在 6 月 1 日，招标代理机构在其官网发布了招标公告。招标公告规定，投标人必须在 6 月 25 日 10:00 前提交投标文件，开标时间定为 6 月 25 日 14:00.

6 月 25 日 14:00,开标工作准时开始，由招标代理机构主持，并要求了所有投标方参加。开标时，招标代理机构工作人员检查了投标文件的密封情况。经确认无误后，当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。

为保证投标工作的公平、公证，A 公司邀请了 7 名来自本公司内部各部门（法律、财务、市场、IT、商务等）的专家或领导组成了评标委员会。评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行了评审和比较。

【问题 1】(6 分)

结合以上案例，请指出以上招标过程中的问题。

【问题 2】(6 分)

假设你是 A 公司负责本次招标的人员，在招标过程中，假如发生以下情况，应该如何处理？

（1）开标前，某投标方人员向你打听其他投标单位的名称、报价等情况。

（2）某投标方 B 公司提交了投标文件之后，在开标前发现投标文件报价有错误，电话联系你希望在评标时进行调整。

【问题 3】(4 分)

结合本案例，判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错误的选项填写“×”）

（1）招标方具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜，而不用委托代理机构。( )

（2）依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至提交投标文件截止之日止，最短不得少于 15 日。( )

微信公众号：野人老师 淘宝店：yerenlaoshi.taobao.com

（3）招标方和投标方应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标方的投标文件订立书面合同。（ ）

（4）在要求提交投标文件截止时间 10 日前，招标方可以以书面形式对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。（ ）

【参考答案】

【问题 1】（6 分）

结合以上案例，请指出以上招标过程中的问题。

1、招标公告只在代理机构官网发布不合适；依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。（招投标法第十六条）

2、开标时间不符合要求，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。（招投标法第三十四条）

3、开标工作不能由招标代理机构主持。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。（招投标法第三十五条）

4、开标人员不符合要求，不是由招标代理机构工作人员检查投标文件的密封情况。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。（招投标法第三十六条）

5、评标专家委员会成员全部来自于公司内部可能不符合规定：一方面技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，此专家应是事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平；二是专家应从政府部分或招标代理机构的专家库内的专家名单中抽取确定。（招投标法第三十七条）

【问题 2】（6 分）

（1）明确拒绝，并告知泄密和串通的严重后果。

（2）不予同意。

根据《招投标法实施条例》：投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标

委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明,不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

【问题 3】（4 分）

（1）√

（2）×，解析：最短不得少于二十日。

（3）√

（4）×，解析：应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com
