2022年下半年案例分析

【2022 年 11 月试题一】

某小家电生产厂家研发一款新设备，部分 WBS 如下表：

工作编号	工作任务	工期
0	研发新设备	
1	硬件	7 月
1.1	Early Sample 设计和生产	2 月
1.2	Develop Sample 设计和生产	2 月
1.3	Product Sample 设计和生产	3 月
2	软件	6 月
2.1	软件设计和基本功能实现	2.5 月
2.2	新功能开发	2 月
2.3	故障修复	3 月

关键时间节点如下：

硬件	项目开始	2022.12.1
	Early Sample 定版	2022.2.15
	Develop Sample 定版	2022.4.10
	Product Sample 定版	2022.5.15
软件	项目开始	2022.12.1
	基线建立，设备点亮	2022.3.5
	功能开发完成	2022.4.30
	代码冻结	2022.5.31
整机	上市	2022.6.18

项目质量经理小张，依据项目 WBS 和关键时间节点，制定了项目质量管理计划，计划中明确了关键质量检查时间和检查方法。尤其是针对故障修复过程，给出了详细的 BUG 跟踪流程和关闭标准。随后安排 QA 小王按照质量管理计划进行检查，并安排测试人员小李进行相关的测试工作，强调不符合关闭标准的一定严格跟踪开发人员返工修改。

【问题 1】(8 分)

（1）结合案例，如果你是质量经理，流程图、核查表、帕累托图可以帮助你检查案例中的哪些质量问题？

（2）除了以上 3 个质量工具，请写出 7 种质量工具中的另外 4 个质量工具。

【问题 2】(6 分)

（1）请指出质量成本中一致性成本和非一致性成本都包含哪些成本；

（2）案例中提到的质量活动涉及的成本都属于哪类质量成本。

【问题 3】(4 分)

判断下列选项的正误(填写在答题纸的对应栏内,正确的选项填写“√”,错误的远项填写“×”)。

（1）案例中的 WBS 采用了分级树形结构的表示形式。（ ）

（2）小王按照质量管理计划进行检查属于质量保证过程的工作。（ ）

（3）小李进行相关的测试工作属于质量控制过程的工作。（ ）

（4）统计抽样的抽样频率和规模不需要预先在质量规划中规定，可根据项目执行情况，临时确定并调整。（ ）

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com

【2022 年 11 月试题二】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某项目的网络资源计划如图所示，已知每位工程师的日均成本为 400 元/天。

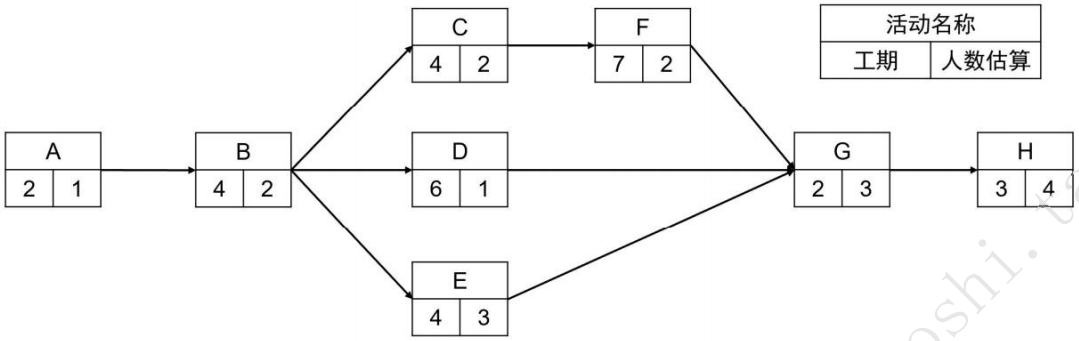

【问题 1】(5 分)

请计算项目的工期及关键路径，并说明活动 E 最晚应在哪天开始。依据是什么?

【问题 2】(8 分)

第 9 日工作结束时，项目组已完成 ABC 三项工作，D 工作完成了三分之一，E 工作完成了二分之一，其余工作尚未开展，此时人力资源管理部门统计总人力成本为 9800 元。

(1)请给出项目此时的挣值;

(2)计算此时项目的 SV 和 CV，并评价项目当前的进度绩效和成本绩效。

【问题 3】(9 分)

假设每位工程师均可胜任各项工作，在不影响工期的前提下。可重新安排有关活动的顺序以减少项目所需人数。此种情况下，请按照项目的网络资源计划。画出项目的时标网络计划图，并判断该项目最少需要多少人?

微信公众号：野人老师
淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com

【2022 年 11 月试题三】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某小区进行物业服务提升，拟上线物业管理系统。该系统包括门禁管理、停车管理、维修服务 管理、收费管理等核心功能及业主论坛等其他功能，物业公司准备通过公开招标的方式采购该 系统。并且发布了招标公告。

信息服务公司 A 得知招标信息后，找到物业公司的负责人，详细介绍了公司的业务背景。提出可以为物业公司定制系统，完全按照物业公司的需求范围和时间要求来完成。并承诺提供终身免费维护，物业公司与 A 公司提前签了意向合同。不过流程仍按照招投标来走，A 公司和物业公司一起准备了一份投标书。

最终物业公司共收到三家公司的投标书。物业公司将开标和评审安排在同一天。评审工作由A公司协助物业公司来完成。物业公司和A公司一起针对其他两家公司投标材料进行了评审。计划借鉴其他两家公司方案，并宣布 A 公司中标，2 个月后物业公司和 A 公司签订了合同。

项目实施的过程中，A 公司将门禁管理系统和停车管理系统分包给另外一家专门做门禁和停车管理系统的公司来实施。

【问题 1】（9 分）

请指出本案例中招投标过程中存在的问题。

【问题 2】（4 分）

请写出“采购管理”包含的主要过程。

【问题 3】（4 分）

请将下面①一④处的答案填写在答题纸的对应栏内。

（1）采购管理中。“自制/外购分析“和“采购审计”分别是①、②过程使用的技术。

（2）一般来说，合同分为总价合同、③和④、

微信公众号：野人老师
淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com

【2022 年 11 月试题四】

阅读下列说明，回答问题 1 至问愿 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 公司承接了某信息系统运行维护项目，项目内容包括对客户数据中心的信息系统进行每周 7 天，每天 24 小时值班、监控、巡检及故障处理等。

为满足客户要求，项目经理张伟制定了详细的运维值班计划，要求项目团队严格按照计划执行。国庆节前，张伟通知小李国庆期间值班，并表示年轻人应该多承担值班工作，如果不服从工作安排，会影响年终考评结果。

某天凌晨 2 点，客户核心业务发生中断。张伟第一时间赶到现场，发现问题复杂，立即电话联系各领域技术人员。得知张伟已在现场后，大家也立刻赶往现场。张伟凭借自己多年运维经验，快速制定了一套解决方案。相关人员一致认可并马上着手实施，迅速恢复了业务。为此，客户高层向 A 公司发送了书面感谢信，对整个运维团队提出了表扬。

为了进一步激励团队，张伟制定了如下藏励措施：

措施 1：为参与项目的员工购买了附加商业保险。

措施 2：工程师非工作时间值班，可以领取额外值班补贴和误餐补贴。

措施 3：每季度评选出 2 位“季度服务之星”，颁发荣誉证书，并请获奖人员在部门季度会议上进行经验分享。

措施 4：每月开展一次团建活动，如户外活动、拓展训练等。

【问题 1】（8 分）

项目经理具备 5 种基本的权力。请结合案例，补充完成下表。

项目经理的权力	张伟行使权力的具体活动
合法的权力	制定运维值班计划，要求项目团队严格按照计划执行

【问题 2】（6 分）

请指出张伟提出的 4 项激励措施，分别针对马斯洛需要层次理论中的哪个层次。

措施 1：（）

措施 2：（）

措施 3：（）

措施 4：（）

【问题 3】（4 分）

判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错误的选项填写“×”）

（1）经理带领团队管理项目的过程中，具有领导者和管理者的双重身份，案例中张伟制定了详细的运维值班计划是在执行领导职能。 （）

(2)张伟制定的运维值班计划需要在项目初期制定,项目后期进展过程中可以根据情况修改。（ ）

(3)“张伟通知小李国庆期间值班,并表示年轻人应该多承担值班工作,如里不服从工作安排会影响年终考评结果这种做法符合 Y 理论对人性的判断。（ ）

(4)张伟制定-系列激励措施是在执行团队管理过程的活动。（ ）

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com
