2023年下半年案例分析试题和试题解析（10月28日第1批）

淘宝 APP 扫码购课　微信公众号　野人老师抖音　野人老师小红书

【2023 年 11 月试题一】

某大型国企 A 与长期合作的系统集成商 B 签订了总承包合同。为了扩容，集成商 B 将原计划在日承包合同中的部分任务调整为使用外采 PaaS 服务时间紧任务重，集成商 B 即刻开始编制公开招标文件外采 PaaS 服务，并 7 月 22 日发出招标公告，规定投标截止时间为 8 月 8 日 18 时。到了截止时间，总共收到了两家公司的投标书，一家是业内成熟的云服务提供商，另一家是某大型互联网企业 C 新成应的云服务事业部，集成商 B 的总经理王总、项目经理小唇 2 位行业专家组成了评标委员会，对两家公司进行了评标，并最终根据报价选定了接近成本价的 C 公司，签订了 2 年的台同，系统上线运行 20 个月时，C 公司进行业务重组，裁撤了效益不好的云服务事业部，开通服务将在 1 个月后停止服务。B 公司重新采购和迁移系统服务将会导致相关业务无法开展。B 和 A 说明了情况，A 以不了解相关情况为由，坚持要求 B 按合同执行。

【问题 1】
结合案例，请简要分析集成商 B 的做法存在的问题。
【问题 2】
案例中 A 要求 B 按照合同执行是否合适?并说明原因
【问题 3】（5 分）
请列出实施采购过程的输入。

【参考答案】
【问题 1】
①发出招标公告到截止投标时间不满 20 日。
②投标人少于 3 个不妥，应重新招标。
③评标委员会应 5 人以上单数，仅两位行业专家组成不妥。
④评标时不能仅根据报价接近成本价选择 C 公司，应综合考虑资质等因素。
⑤B 公司未提前识别 C 公司有可能停止服务的风险。
⑥公司没有提前和 A 公司提前约定变更。
【问题 2】
不合适。
①对于合同不明确的情况，应当先协商，达成补充协议。不能达成补充协议的，依照合同有关条款或交易习惯确定。
②变更需要合同双方当事人协商一致才可以协商执行，如有重大争议可以通过法律或者仲裁手段解决。

【问题 3】
实施采购的输入有:采购管理计划、供方选择标准、采购文件、采购工作说明书、卖方建议书、自制/外购决策、组织过程资产、事业环境因素。

【2023 年 11 月试题二】
某项目基本情况如下表所示：

活动	紧前活动	工期(天)	最短工期(天)	正常总费用(元)	赶工费用(元/天)
A	/	1	1	5000	/
B	A	3	2	5000	7000
C	A	7	4	11000	1000
D	B	5	3	10000	2000
E	B	8	6	8500	2000
F	C、D	4	2	8500	4000
G	E、F	1	1	5000	/

例如：C 活动工期 7 天，压缩成 5 天，C 的费用是 11000+1000*（7-5）=13000 元
【问题 1】
计算项目关键路径、项目总工期、项目 BAC（3 分）
【问题 2】
计算项目第 9 天时的 SV 和 CV，并判断项目的绩效情况（9 分）

活动	计划活动百分比	完成百分比	实际花费
A	100%	100%	33000 元
B	100%	100%	
C	100%	100%	
D	100%	90%	
E	50%	60%	

【问题 3】
如果采取纠正措施，项目的 EAC 是多少？（3 分）
【问题 4】结合案例，在项目计划阶段，如果项目提前 2 天完工，请回答问题（6 分）
（1）在保证总费用最低的条件下，请问首先压缩那个活动？为什么？
（2）在（1）的基础上，给出提前 2 天完工的整体压缩方案，并计算压缩后的项目总费用。

【参考答案】
【问题 1】

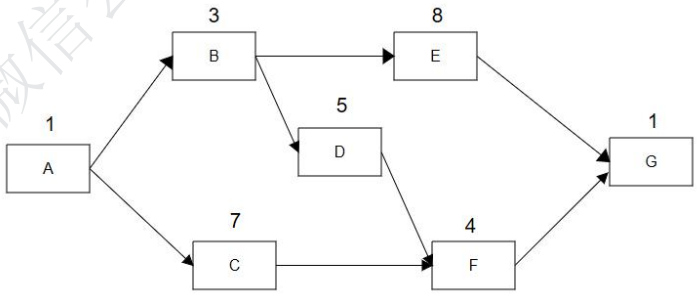

关键路径: ABDFG

项目总工期：14 天
项目 BAC=5000+5000+11000+ 10000+8500+8500+5000=53000 元
【问题 2】
PV=5000*100%+5000*100%+11000*100%+10000*100%+8500*50%=35250 元
EV=5000*100%+5000*100%+11000*100%+10000*90%+8500*60%=35100 元
AC=33000 元
所以:
SV=EV-PV=35100-35250=-150 元
CV=EV-AC=35100-33000=2100 元
SV<0,CV>0
所以进度落后，成本节约。
【问题 3】
采取纠正措施，就是非典型。EAC=AC+（BAC-EV）=33000+（53000-35100）=50900 元。
【问题 4】

活动	紧前活动	工期(天)	最短工期(天)	可压缩天数	正常总费用(元)	赶工费用(元/天)
A	/	1	1	0	5000	/
B	A	3	2	1	5000	7000
C	A	7	4	3	11000	1000
D	B	5	3	2	10000	2000
E	B	8	6	2	8500	2000
F	C、D	4	2	2	8500	4000
G	E、F	1	1	0	5000	/

【注：压缩的步骤
（1）首先考虑压缩关键路径上的活动
（2）压缩关键路径上能压缩的活动
（3）压缩最便宜的活动
（4）压缩后看关键路径有无变化
】
项目中有三条路径，都是大于 12 的，ABEG =13、ABDFG=14、ACFG=13
（1）首先压缩 D，因为 D 是关键路径的关键活动，其每天压缩费用最低 2000 元。
（2）D 压 2 天，增加 4000 元、E 压 1 天，增加 2000 元、C 压 1 天，增加 1000 元
压缩后的项目总费用=53000+ 7000=60000 元。
【注解：D 压缩后，ABEG =13，ABDFG=12，ACFG=13
接着压缩 ABEG =13、ACFG=13
需要两条路径同时压缩，E 和 C 的组合最便宜是 3000，不能选 B 和其他的组合，因为光 B 就是 7000。】

【2023 年 11 月试题三】

某系统集成公司中标本市商业银行信息系统建设项目，该项目根据客户业务需求，对社保基金财务系统、对公联户管理率统等 26 个系统进行开发建没。作为投标工作的负责人，老刘任命小孙为项目经理，一起编写了项目管理计划，由于工期紧张，仅确定了团队成员、进度计划、大概的预算后组织相关人员开始各个系统的开发建设工作。

关于安全设备，小孙认为可以由合作多年的密码设备厂商 A 按需供货，于是按照厂商 A 的接口运行了开发。几个月后，项目集成测试时，发现厂商 A 在半年前被清除出公司供应商名录，项目组不得不联系采购部重新寻找新的供应商。为了不影响项目整体进度，小孙直接按照架构调节方案安排项目中 80%的开发人员按照新方案进行开发，导致集成测试中发现的问题无法及时修复。

【问题 1】
分析案例，请从项目整体管理的角度指出项目当前存在的问题。
【问题 2】
请列出项目经理作为整合者必须完成的工作。
【问题 3】
判断：
（1）在项目管理中，整合管理兼具统一、合并、沟通和建应联系的性质，项目整合管理贯穿项目始终。（）
（2）为了更好地了解项目的目的、目标和预期收益，以便更有效地分配项目资源，项目章程一般由项目经理编制。（）
（3）制订项目管理计划是定义、准备和协调项目计划的所有组成部分，把它们整合成一份综合项目管理计划的过程，本过程仅开展一次或在项目预定义时开展。（）
（4）在整个项目生命周期的任何时间，参与项目的任何干系人都可以提出高更请求。（）
（5）在项目执行过程中，如果对基准进行了变更，可以基于新版本的基准来调整现在的绩效。（）

【参考答案】
【问题 1】
①没有制定项目章程。
②投标负责人和项目经理一起编制项目管理计划不妥，应有主要干系人参与，并经高层审批。
③小孙不能未经调研直接选择由密码设备厂商 A 供货，每次合作前都需核对公司供应商名录。
④指导与管理项目工作不到位，未进行开踢会议。
⑤监控项目工作存在问题，监控不力导致实施后出现供应商的问题。
⑥缺少规范的整体变更控制流程。
⑦结束项目工作的内容不全面，还应进行总结经验教训等工作。
【问题 2】
作为整合者，项目经理必须：
①通过与项目干系人主动、全面的沟通，来了解他们对项目的需求。
②在相互竞争的众多干系人之间寻找平衡点。
③通过认真、细致的协调工作，来达到各种需求间的平衡，实现整合。
【问题 3】
（1）√ （2）× （3）√ （4）√ （5）×

【2023 年 11 月试题四】
目前无背景文字部分，根据野人老师学员的回忆，案例分析考察的内容为：
考察领域：风险管理
【问题 1】

风险按照产生原因划分可以分为哪些风险？

【问题 2】

背景（1）-（5）中描述的是不是风险，如果是属于哪种类型的风险？

【问题 3】

制定风险应对措施需要理解（1），这是一种可据此分析风险应对计划是否正在发挥应有作用的机制。其中包括确定和分配某个人（风险应对责任人）来实施已获同意和资金支持的风险应对措施。风险应对措施必须与（2）相匹配，能经济有效地应对挑战。

当风险出现时，不同的人会持有不同的态度（3）、（4）、（5）。

【参考答案】

【问题 1】

自然风险、社会风险、政治风险、经济风险、技术风险

【问题 2】

（1）不是风险

（2）是风险，属于自然风险

（3）是风险，属于技术风险

（4）是风险，属于社会风险

（5）是风险，属于政治风险

【问题 3】

（1）风险处理机制

（2）风险的重要性

（3）厌恶型、（4）促进型、（5）中间型

淘宝店铺：yeren.taobao.com

微信公众号：野人老师
