每日一练----收尾过程组、组织保障----题目

1、对于在完工前就提前终止的项目，应该在哪个过程中调查和记录提前终止的原因?
A、结束项目或阶段
B、指导与管理项目工作
C、制订项目管理计划
D、适用于项目所处阶段的具体过程。

2、（）不是项目结束阶段的输入?
A、项目管理计划;
B、采购文档;
C、项目最终报告;
D、验收的可交付成果;

3、（）不属于收尾过程组的工作?
A、解散项目团队;
B、控制变更，推荐纠正措施;
C、对组织过程资产进行更新;
D、获得客户或发起人的验收;

4、在收尾过程组的重点工作中，（）是首要环节?
A、项目移交;
B、项目总结;
C、项目评估;
D、项目验收;

5、在项目收尾过程中，关于试运行的描述，不正确的是（）?
A、试运行期间系统发生的问题，可能是系统缺陷，也可能是额外的新需求;
B、试运行过程中识别的新需求，应马上执行变更流程予以处理;
C、为了检验系统的试运行情况，客户可将部分数据或配置信息加载到信息系统上进行正常操作;

6、在配置管理中，基线是一组经过审查并且达成一致的规范或工作产品，是开发工作的基础。配置管理员根据《项目计划文档》、《配置管理计划》、《配置项管理表》等文档，创建（）基线?
A、内部或外部;
B、设计或构造;
C、计划或发行;
D、构造或发行;

免费题库 － 微信搜索：软考达人

7、要对软件产品进行升级，程序员对配置库的操作顺序正常的是（）

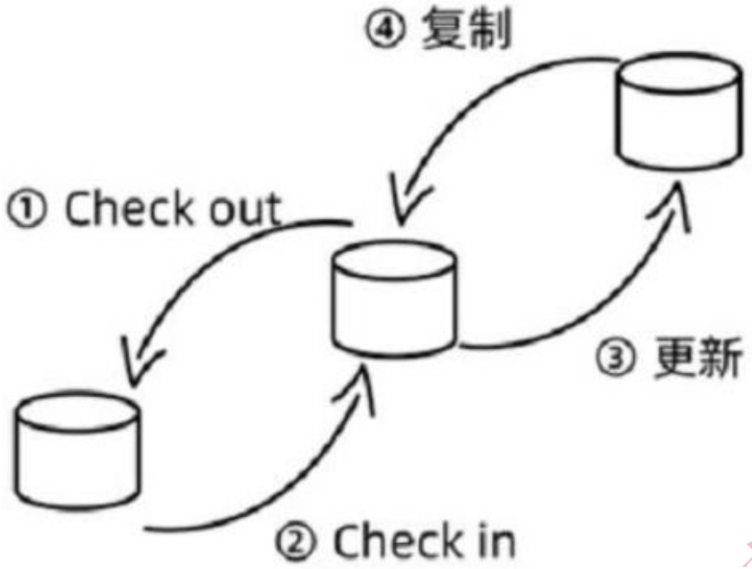

A、①②③④
B、④①②③
C、②③①④
D、③④①②

8、关于配置审计的描述，不正确的是：()。
A、配置审计的实施是为了确保项目配置管理的有效性
B、功能配置审计需验证配置项的开发已圆满完成
C、功能配置审计需验证要交付的配置项是否存在
D、物理配置审计需验证配置项是否包含所有必需的项

9、关于变更管理的描述，不正确的是:（ ）。
A、每次变更通过评审后，都应重新确定基准
B、必须采用变更管理工具
C、明确变更工作中评估、评审、执行的职责
D、评估变更的可能影响

10、研发人员应将正在研发调试的模块、文档和数据元素存入(　)
A、开发库
B、产品库
C、受控库
D、基线库

免费题库 微信搜索：软考达人

每日一练----收尾过程组、组织保障----解析

1、对于在完工前就提前终止的项目，应该在哪个过程中调查和记录提前终止的原因?

A、结束项目或阶段

B、指导与管理项目工作

C、制订项目管理计划

D、适用于项目所处阶段的具体过程。

【参考答案】A

【试题解析】软考中项教程第三版 P539：如果项目在完工前就提前终止，结束项目或阶段过程还需要制定程序，来调查和记录提前终止的原因。

2、（）不是项目结束阶段的输入?

A、项目管理计划;

B、采购文档;

C、项目最终报告;

D、验收的可交付成果;

【参考答案】C

【试题解析】软考中项教程第三版 P538：结束项目或阶段的输入----项目章程、项目管理计划（选项 A）、项目文件、验收的可交付成果（选项 D）、立项管理文件、协议、采购文档（选项 B）、组织过程资产。而选项 C 是该过程的输出，不是输入。

3、（）不属于收尾过程组的工作?

A、解散项目团队;

B、控制变更，推荐纠正措施;

C、对组织过程资产进行更新;

D、获得客户或发起人的验收;

【参考答案】B

【试题解析】选项 A、C、D 都属于讲义 PPT 上对于收尾过程组的工作的总结的 6+2 的步骤中的事。而选项 B 属于监控过程组的工作，不属于收尾过程组。

4、在收尾过程组的重点工作中，（）是首要环节?

A、项目移交;

B、项目总结;

C、项目评估;

D、项目验收;

【参考答案】D

【试题解析】软考中项教程第三版 P541：项目验收是项目收尾中的收要环节。

5、在项目收尾过程中，关于试运行的描述，不正确的是（）?

免费题库 － 微信搜索：软考达人

A、试运行期间系统发生的问题，可能是系统缺陷，也可能是额外的新需求；
B、试运行过程中识别的新需求，应马上执行变更流程予以处理；
C、为了检验系统的试运行情况，客户可将部分数据或配置信息加载到信息系统上进行正常操作；
D、在试运行期间，甲乙双方可以进一步确定具体的工作内容并完成相应的交接工作；
【参考答案】B
【试题解析】软考中项教程第三版 P542：对于在试运行期间系统发生的问题，根据其性质判断是否是系统缺陷，如果是系统缺陷，应该及时更正系统的功能；如果不是系统自身缺陷，而是额外的信息系统新需求（选项 A 正确），可以遵循项目变更流程进行变更，也可以将其暂时搁置（选项 B 说的应马上执行变更处理就太绝对了），作为后续升级项目工作内容的一部分。
选项 C 和 D 都是 P541 上的原话，所以是正确的。

6、在配置管理中，基线是一组经过审查并且达成一致的规范或工作产品，是开发工作的基础。配置管理员根据《项目计划文档》、《配置管理计划》、《配置项管理表》等文档，创建（）基线？
A、内部或外部；
B、设计或构造；
C、计划或发行；
D、构造或发行；
【参考答案】D
【试题解析】软考中项教程第三版 P551：基线通常对应于开发过程中的里程碑，一个产品可以有多个基线，也可以只有一个基线。交付给外部顾客的基线一般称为发行基线，内部开发使用的基线一般称为构造基线。

免费题库 微信搜索：软考达人

7、要对软件产品进行升级，程序员对配置库的操作顺序正常的是（）

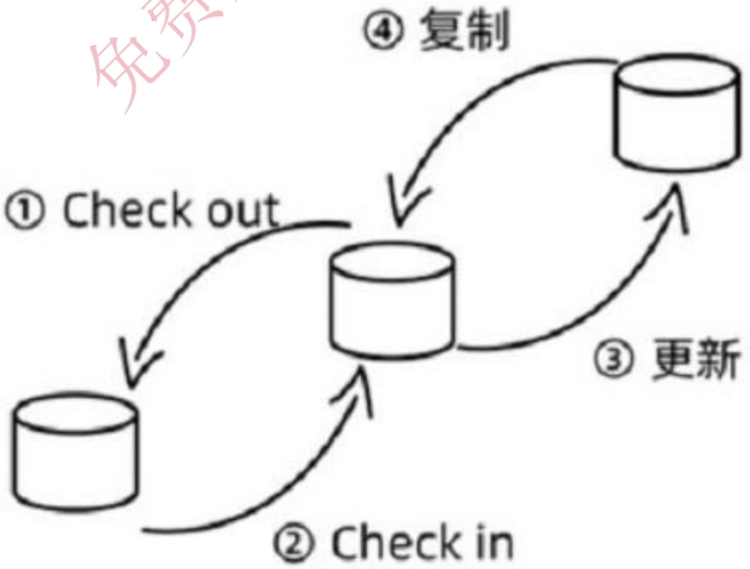

A、①②③④
B、④①②③
C、②③①④
D、③④①②
【参考答案】B
【试题解析】软考中项教程第三版 P557：参看图 15-3 的产品升级流程。

8、关于配置审计的描述，不正确的是：()。
A、配置审计的实施是为了确保项目配置管理的有效性
B、功能配置审计需验证配置项的开发已圆满完成
C、功能配置审计需验证要交付的配置项是否存在
D、物理配置审计需验证配置项是否包含所有必需的项
【参考答案】C
【试题解析】软考中项教程第三版 P558：选项 C 是物理配置审计的验证内容。
功能配置审计----审计配置项的一致性（配置项的实际功效是否与其需求一致），具体验证：1、配置开发已圆满完成；2、配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征；3、配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的。
物理配置审计----审计配置项的完整性（配置项的物理存在是否与预期一致），具体验证：1、要交付的配置项是否存在。2、配置项中是否包含了所有必须的项目。

9、关于变更管理的描述，不正确的是：（ ）。
A、每次变更通过评审后，都应重新确定基准
B、必须采用变更管理工具
C、明确变更工作中评估、评审、执行的职责
D、评估变更的可能影响
【参考答案】B
【试题解析】选项 B 的说法太绝对了，吃饭必须使用筷子么？

10、研发人员应将正在研发调试的模块、文档和数据元素存入(　)
A、开发库
B、产品库
C、受控库
D、基线库
【参考答案】A
【试题解析】软考中项教程第三版 P552：开发库，也称为动态库、程序员库或工作库，用于保存开发人员当前正在开发的配置实体，如：新模块、文档、数据元素或进行修改的已有元素。

免费题库 － 微信搜索：软考达人
